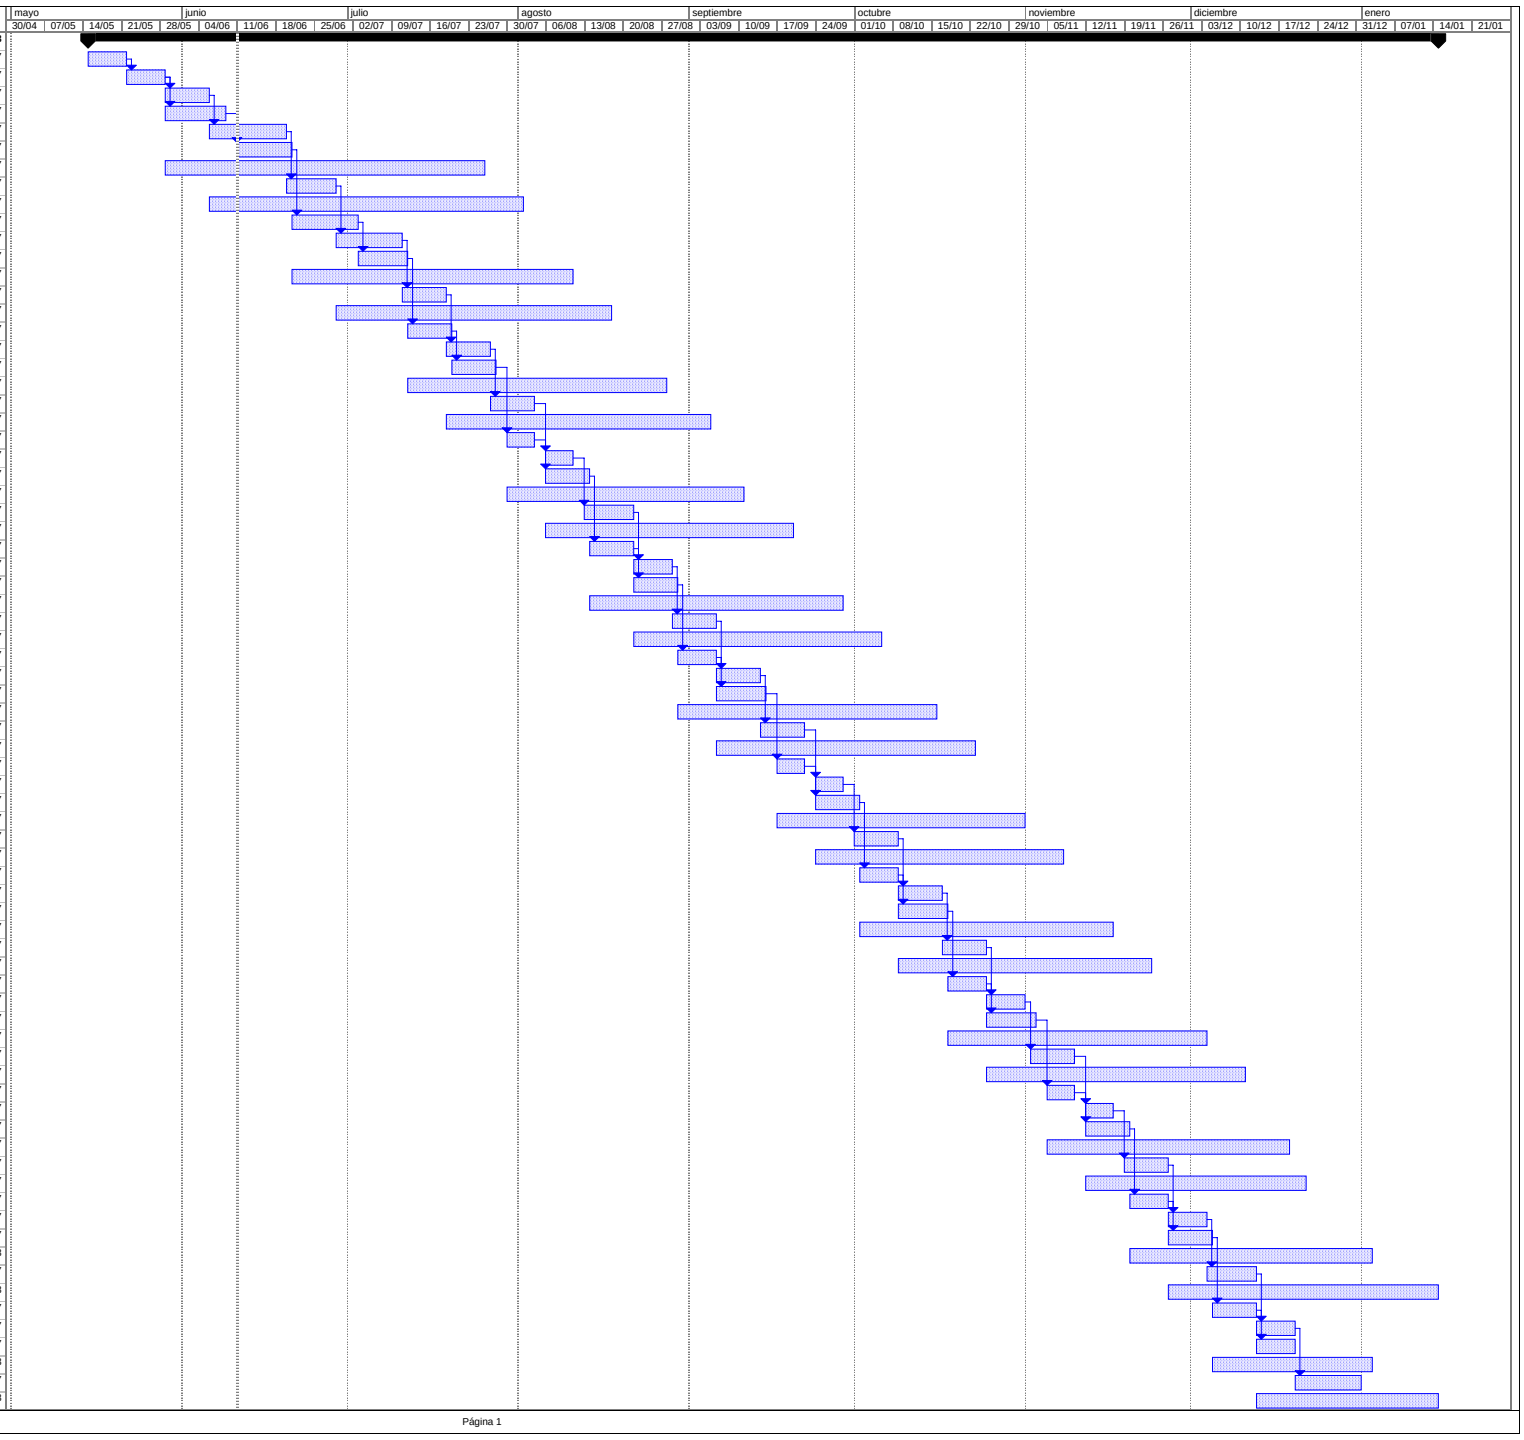Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**ESTRUCTURA CA L'ARANYÓ**	**165 días**	**mar 15/05/07**	**lun 14/01/08**
2	Túnel instal·lacions	5 días	mar 15/05/07	lun 21/05/07
3	Llosa fonamentació sector C-D	5 días	mar 22/05/07	lun 28/05/07
4	Llosa fonamentació sector E	5 días	mar 29/05/07	mar 05/06/07
5	Murs sector C-D planta soterrani	8 días	mar 29/05/07	vie 08/06/07
6	Murs circulars sector E planta soterrani	10 días	mié 06/06/07	mar 19/06/07
7	Forjat sector C-D planta soterrani	8 días	lun 11/06/07	mié 20/06/07
8	Apuntalat i desapuntalat forjat P.Soterrani C-D	41 días	mar 29/05/07	mié 25/07/07
9	Forjat sector E planta soterrani	7 días	mié 20/06/07	jue 28/06/07
10	Apuntalat i desapuntalat forjat P.Soterrani E	41 días	mié 06/06/07	mié 01/08/07
11	Murs sector C-D planta baixa	8 días	jue 21/06/07	lun 02/07/07
12	Murs circulars sector E planta baixa	8 días	vie 29/06/07	mar 10/07/07
13	Forjat sector C-D planta baixa	7 días	mar 03/07/07	mié 11/07/07
14	Apuntalat i desapuntalat forjat P.Baixa C-D	37 días	jue 21/06/07	vie 10/08/07
15	Forjat sector E planta baixa	6 días	mié 11/07/07	mié 18/07/07
16	Apuntalat i desapuntalat forjat P.Baixa E	35 días	vie 29/06/07	vie 17/08/07
17	Murs sector C-D planta primera	6 días	jue 12/07/07	jue 19/07/07
18	Murs sector E planta primera	6 días	jue 19/07/07	jue 26/07/07
19	Forjat sector C-D planta primera	6 días	vie 20/07/07	vie 27/07/07
20	Apuntalat i desapuntalat forjat P.Primera C-D	32 días	jue 12/07/07	lun 27/08/07
21	Forjat sector E planta primera	6 días	vie 27/07/07	vie 03/08/07
22	Apuntalat i desapuntalat forjat P.Primera E	33 días	jue 19/07/07	mar 04/09/07
23	Murs sector C-D planta segona	5 días	lun 30/07/07	vie 03/08/07
24	Murs sector E planta segona	5 días	lun 06/08/07	vie 10/08/07
25	Forjat sector C-D planta segona	6 días	lun 06/08/07	lun 13/08/07
26	Apuntalat i desapuntalat forjat P.Segona C-D	30 días	lun 30/07/07	lun 10/09/07
27	Forjat sector E planta segona	6 días	lun 13/08/07	mar 21/08/07
28	Apuntalat i desapuntalat forjat P.Segona E	31 días	lun 06/08/07	mié 19/09/07
29	Murs sector C-D planta tercera	5 días	mar 14/08/07	mar 21/08/07
30	Murs sector E planta tercera	5 días	mié 22/08/07	mar 28/08/07
31	Forjat sector C-D planta tercera	6 días	mié 22/08/07	mié 29/08/07
32	Apuntalat i desapuntalat forjat P.Tercera C-D	32 días	mar 14/08/07	vie 28/09/07
33	Forjat sector E planta tercera	6 días	mié 29/08/07	mié 05/09/07
34	Apuntalat i desapuntalat forjat P.Tercera E	32 días	mié 22/08/07	vie 05/10/07
35	Murs sector C-D planta quarta	5 días	jue 30/08/07	mié 05/09/07
36	Murs sector E planta quarta	5 días	jue 06/09/07	jue 13/09/07
37	Forjat sector C-D planta quarta	6 días	jue 06/09/07	vie 14/09/07
38	Apuntalat i desapuntalat forjat P.Quarta C-D	31 días	jue 30/08/07	lun 15/10/07
39	Forjat sector E planta quarta	6 días	vie 14/09/07	vie 21/09/07
40	Apuntalat i desapuntalat forjat P.Quarta E	31 días	jue 06/09/07	lun 22/10/07
41	Murs sector C-E planta cinquena	5 días	lun 17/09/07	vie 21/09/07
42	Murs sector E planta cinquena	5 días	lun 24/09/07	vie 28/09/07
43	Forjat sector C-D planta cinquena	6 días	lun 24/09/07	lun 01/10/07
44	Apuntalat i desapuntalat forjat P.Cinquena C-D	32 días	lun 17/09/07	mié 31/10/07
45	Forjat sector E planta cinquena	6 días	lun 01/10/07	lun 08/10/07
46	Apuntalat i desapuntalat forjat P.Cinquena E E	31 días	lun 24/09/07	mié 07/11/07
47	Murs sector C-D planta tècnica	5 días	mar 02/10/07	lun 08/10/07
48	Murs sector E planta tècnica	5 días	mar 09/10/07	mar 16/10/07
49	Forjat sector C-D planta tècnica	6 días	mar 09/10/07	mié 17/10/07
50	Apuntalat i desapuntalat forjat P.Tecnica C-D	32 días	mar 02/10/07	vie 16/11/07
51	Forjat sector E planta tècnica	6 días	mié 17/10/07	mié 24/10/07
52	Apuntalat i desapuntalat forjat P.Tecnica E	32 días	mar 09/10/07	vie 23/11/07
53	Murs sector C-D planta sisena	5 días	jue 18/10/07	mié 24/10/07
54	Murs sector E planta sisena	5 días	jue 25/10/07	mié 31/10/07
55	Forjat sector C-D planta sisena	6 días	jue 25/10/07	vie 02/11/07
56	Apuntalat i desapuntalat forjat P.Sisena C-D	32 días	jue 18/10/07	lun 03/12/07
57	Forjat sector E planta sisena	6 días	vie 02/11/07	vie 09/11/07
58	Apuntalat i desapuntalat forjat P.Sisena E	31 días	jue 25/10/07	lun 10/12/07
59	Murs sector C-D planta setena	5 días	lun 05/11/07	vie 09/11/07
60	Murs sector E planta setena	5 días	lun 12/11/07	vie 16/11/07
61	Forjat sector C-D planta setena	6 días	lun 12/11/07	lun 19/11/07
62	Apuntalat i desapuntalat forjat P.Setena C-D	31 días	lun 05/11/07	mar 18/12/07
63	Forjat sector E planta setena	6 días	lun 19/11/07	lun 26/11/07
64	Apuntalat i desapuntalat forjat P.Setena E	29 días	lun 12/11/07	vie 21/12/07
65	Murs sector C-D planta vuitena	5 días	mar 20/11/07	lun 26/11/07
66	Murs sector E planta vuitena	5 días	mar 27/11/07	lun 03/12/07
67	Forjat sector C-D planta vuitena	6 días	mar 27/11/07	mar 04/12/07
68	Apuntalat i desapuntalat forjat P.Vuitena C-D	27 días	mar 20/11/07	mié 02/01/08
69	Forjat sector E planta vuitena	6 días	mar 04/12/07	mié 12/12/07
70	Apuntalat i desapuntalat forjat P.Vuitena E	30 días	mar 27/11/07	lun 14/01/08
71	Murs sector C-D planta novena	5 días	mié 05/12/07	mié 12/12/07
72	Murs sector E planta novena	5 días	jue 13/12/07	mié 19/12/07
73	Forjat sector C-D planta novena	5 días	jue 13/12/07	mié 19/12/07
74	Apuntalat i desapuntalat forjat P.Novena C-D	16 días	mié 05/12/07	mié 02/01/08
75	Forjat sector E planta novena	5 días	jue 20/12/07	lun 31/12/07
76	Apuntalat i desapuntalat forjat P.Novena E	19 días	jue 13/12/07	lun 14/01/08
